資料―３

令 和 ６ 年 ３ 月 ２ ２ 日
第2回新宿区移動等円滑化促進方針推進協議会
新宿区みどり土木部 道路課

「バリアフリーの道づくり」事業について

新宿区における今年度の「バリアフリーの道づくり」事業について、ご報告します。

１ 詳細設計及び意見交換会の概要について

〇新宿通り（新宿御苑前駅から新宿二丁目交差点まで）

・第１回意見交換会

日　程　：令和５年９月 29 日（金）午前 10 時から

参 加 者：9 名（障害者団体連絡協議会、高齢者クラブ連合会、新宿大通商店街振興組合）

〇社会福祉協議会前区道（早稲田通りから高田馬場１丁目 10 番まで）

・第２回意見交換会

日　程　：令和５年 10 月６日（金）午前 10 時から

参 加 者：10 名（障害者団体連絡協議会、高齢者クラブ連合会、社会福祉協議会）

〇当日写真

社会福祉協議会前区道の「まちあるき」

「まちあるき」後の意見交換

〇主なご意見とその対応

別紙３－１のとおり

〇各路線の整備内容について

別紙３－２（新宿通り）及び別紙３－３（社会福祉協議会前区道）のとおり

２　バリアフリー整備工事について

○区役所通り

・令和５年 10 月着手、令和６年３月工事完了予定。

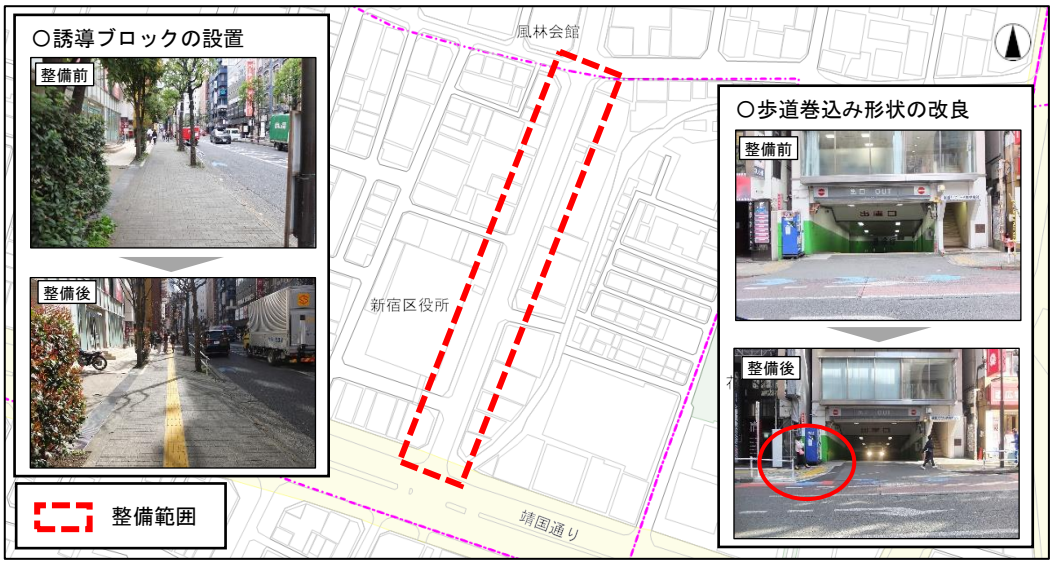

Copyright(C)NTT空間情報 All Rights Reserved

○新宿通り（第Ⅰ期）

・入札不調のため規模を縮小して再発注。

・令和５年 12 月着手、令和６年５月工事完了予定。

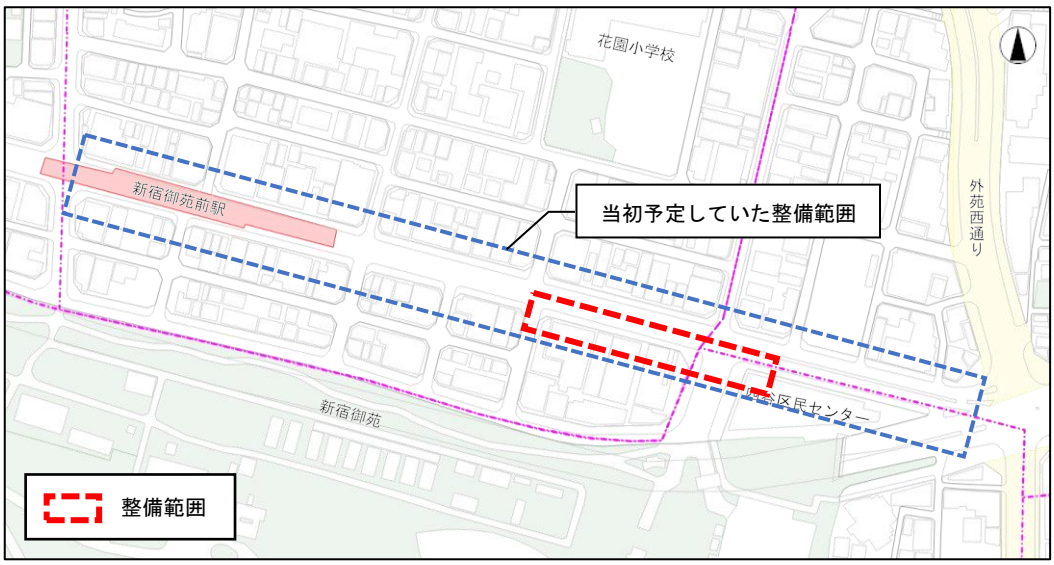

Copyright(C)NTT空間情報 All Rights Reserved

３　今後の予定について

令和６年度は新宿通り（第Ⅱ期）、社会福祉協議会前区道のバリアフリー整備を行います。また、中央病院通り、ＢＩＺ新宿前区道について、当事者等との意見交換会を開催し、設計を進めてまいります（令和７年度整備予定）。

【令和６年度の取組み内容】

No	通称名等（路線名）	延長	取組み内容
①	新宿通り（第Ⅱ期） （特別区道 41-560, 900）	約 593m	バリアフリー整備
②	社会福祉協議会前区道 （特別区道 22-1700, 1701）	約 310m	バリアフリー整備
③	中央病院通り （特別区道 22-270, 22-330）	約 863m	意見交換会、詳細設計 （Ｒ７年度整備予定）
④	ＢＩＺ新宿前区道 （特別区道 11-500）	約 250m	意見交換会、詳細設計 （Ｒ７年度整備予定）

【路線箇所】

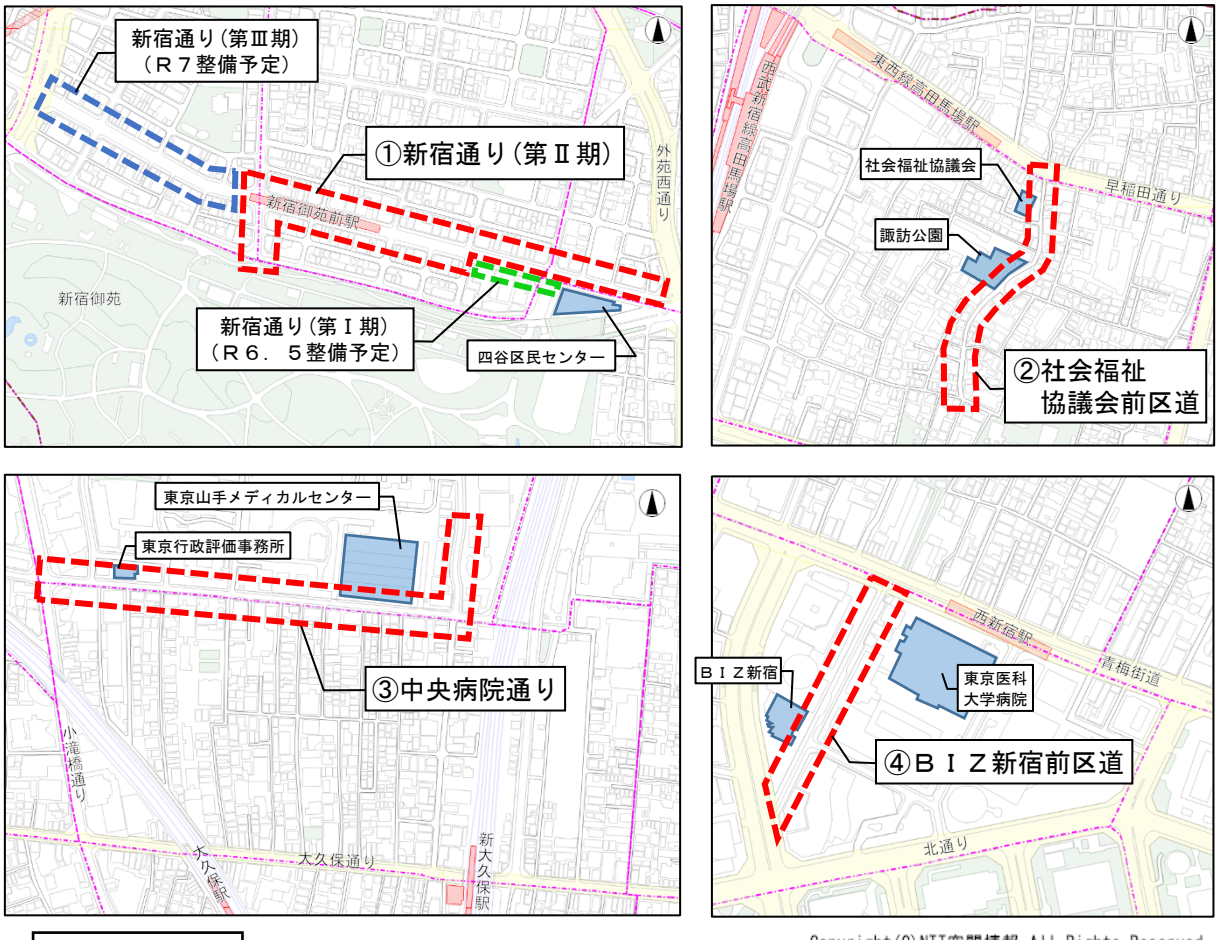

Copyright(C)NTT空間情報 All Rights Reserved
